

AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO –ACUMAR–

## Limpieza de Márgenes

### INFORME DE GESTIÓN\*



\* Información presentada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación el pasado el 16 de mayo de 2011.



## Grado de ejecución de las obras de forestación

### Plantación de árboles y colocación de defensas

Se viene desarrollando desde fines de 2008, la limpieza, forestación y colocación de defensas mediante mojonos para impedir la descarga de residuos en las márgenes del Riachuelo en su curso actual rectificado y en el cauce original hasta mediados de 2010, cuando las cooperativas ya se encontraban operativas y trabajando sobre las márgenes de la rivera del Riachuelo.

TRAMO EJECUTADO	Forestación Cantidad de arboles	Defensas Cant. mojonos
I.- Desde camino de Cintura hasta calle I. Newton.	4 800	2 400
II.- Desde calle I. Newton hasta calle Claudio de Alas	1 255	1 256
III.- Desde calle Claudio de Alas hasta Puente La Noria	1 200	1 200
IV.- Desde Puente La Noria hasta Puente Uriburu	3 300	6 600
V.- Desde Puente Uriburu hasta Puente Victorino de la Plaza	1 060	
VI.- Desde Puente Bosch hasta Portón de Exologística	500	-
Total	<b>12 115</b>	<b>11 456</b>

El trabajo inicial de las cooperativas que iniciaron sus tareas de extracción de residuos hacia fines de 2009, requirió un entrenamiento en lo laboral y el empezar a desarrollar actividades más complejas como las actuales, se encuentra en una etapa de desarrollo superior, ya comenzando con algunas tareas de plantado y preservación de especies autóctonas que permitirán el desarrollo de un hábitat adecuado y la factibilidad de perchas adecuadas para convertir al Riachuelo en un corredor de aves nativas.

## Grado de ejecución del convenio entre la ACUMAR y AYSA

Las obras del proyecto “limpieza de márgenes del río Matanza-Riachuelo”, en el marco del convenio entre la ACUMAR y AySA, dieron comienzo el 2 de noviembre de 2009 y fueron transferidas a esta Autoridad de Cuenca el 31 de marzo de 2011.

Durante dicho período se realizaron tareas en siete jurisdicciones, sobre 35 áreas de intervención, desarrollando la limpieza inicial de más de 150 km de márgenes de ríos y arroyos




de la cuenca, y habiendo recolectado más de 67.000 toneladas de residuos, con la participación, a la fecha de transferencia, de más de 2.000 cooperativistas.

Estas tareas desarrolladas por las cooperativas se han visto traducidas en una inversión total aproximada de \$120.000.000 (pesos ciento veinte millones) partida de la ACUMAR.


### Estado de avance y funcionamiento de las cooperativas

En términos de avance de obra, se ha limpiado y mantenido el 52% de la extensión de los cauces, con un ritmo promedio de 9 km por mes, retirando y disponiendo 1,30 toneladas de residuos por km por día, lo que representa un jornal de 98 kg de residuos sólidos urbanos extraídos por cada cooperativista por cada día de trabajo.


En los siguientes gráficos se muestra con indicadores el nivel de ejecución realizado por AySA.

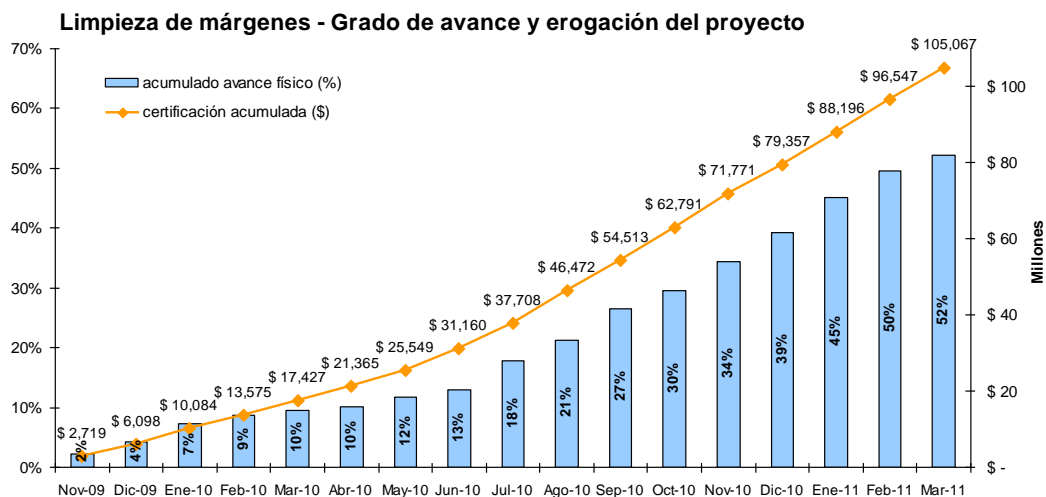

### Limpieza de márgenes - Dotación de cooperativistas asignados al proyecto

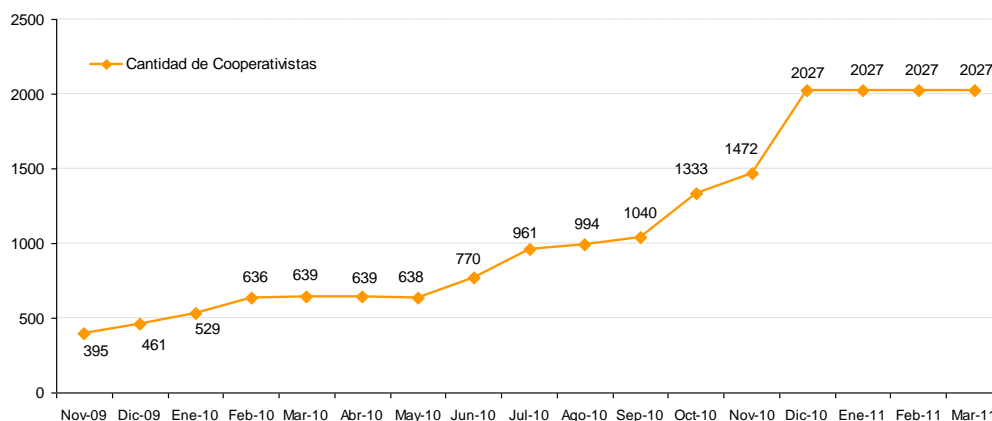

### Limpieza de márgenes - Longitud de márgenes saneadas y residuos extraídos

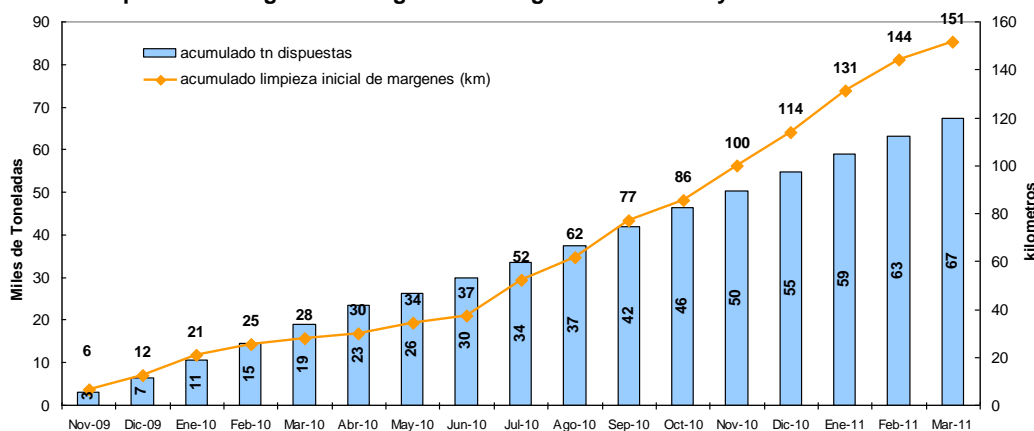

## Resultados de la actividad en espejo de agua

En relación a la limpieza y mantenimiento de las márgenes y del espejo de agua del río Matanza – Riachuelo, se extraen residuos sólidos flotantes mediante catamaranes y se recogen de las márgenes del río un total en promedio de 350 toneladas por mes. Del mismo modo, se procede al retiro de carrocerías de vehículos y decenas de objetos voluminosos.

La inversión realizada hasta la fecha es de \$27.736.495

La cantidad de personas que trabajan en las tareas de limpieza de márgenes y espejo de agua es de 57 personas. Entre las tareas que desarrollan se encuentran las administrativas, operativas y de supervisión.



## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL ESPEJO DE AGUA DEL RÍO MATANZA – RIACHUELO

MES	toneladas	Tn acumuladas
ene-09	193,18	193,18
feb-09	305,08	498,26
mar-09	383,58	881,84
abr-09	247,14	1128,98
may-09	303,62	1432,6
jun-09	453,66	1886,26
jul-09	288,72	2174,98
ago-09	342,82	2517,8
sep-09	192,5	2710,3
oct-09	217,44	2927,74
nov-09	475,46	3403,2
dic-09	449,9	3853,1
ene-10	417,62	4270,72
feb-10	443,26	4713,98
mar-10	464	5177,98
abr-10	312,28	5490,26
may-10	414,5	5904,76
jun-10	345,08	6249,84
jul-10	320,09	6569,93
ago-10	340,14	6910,07
sep-10	352	7262,07
oct-10	362,3	7624,37
nov-10	327,08	7951,45
dic-10	0	7951,45
ene-11	321	8272,45
feb-11	451	8723,45
mar-11	342	9065,45
<b>TOTAL</b>		<b>9065,45</b>



Además de ello, la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo ha llevado a cabo la tarea ordenada por Justicia para extraer la totalidad de buques inactivos que se hallaban en el Riachuelo, entre Puente Pueyrredón y Puente Avellaneda.

En dicha acción, se extrajeron 57 buques desde 2007, de los cuales 31 fueron reflotados, retirados y puestos a seco por la Prefectura Naval Argentina, en tanto que otros 26 fueron retirados por sus propietarios intimados por la ACUMAR.

Fue en razón de esto que el Sr. Juez Federal de Quilmes, el día 14 de abril pasado resolvió tener por cumplida la orden judicial en lo que respecta a la extracción de buques y artefactos navales hundidos o inactivos que se encontraban sobre el Riachuelo, entre el Puente Pueyrredón y el Puente Avellaneda.

